

WICHTIGE INFORMATIONEN

ZUR AUFSTELLUNG IHRES NEUEN POOLS



VIELEN DANK!

Herzlichen Dank für Ihr Vertrauen in ExportPools und wir freuen uns, dass Sie bald Ihr Pool geliefert bekommen. Sie haben damit ein hochwertiges Produkt aus der Tschechischen Republik, das alle anspruchsvollen Anforderungen der heutigen Zeit erfüllt, erworben. Damit Ihrem Badespaß nichts mehr im Wege steht, sind vor der Lieferung Ihres Pools einige Vorbereitungsarbeiten durch Sie oder durch einen von Ihnen beauftragten Professionisten zu erledigen. Hier erfahren Sie alles was noch wichtig ist.

Viel Spaß mit und in Ihrem neuen Pool!
Die Geschäftsführung

WARNUNG

Bitte beachten Sie alle Informationen in diesem Informationsblatt zur Aufstellung Ihres Pools. Eine Nichtbeachtung einzelner Punkte oder eine unsachgemäße Umsetzung, kann zu bedeutenden und irreversibler Beschädigungen des Pools führen und auch zum Verfall der Garantie seitens des Herstellers. Diese Informationsunterlage ist ein integrierter Bestandteil jeder Pool Bestellung und wurde Ihnen von einem Vertreter unserer Handelspartner übergeben.

MATERIALEIGENSCHAFTEN

Unsere Polypropylen Pools sind aus homogenen Polypropylen Platten hergestellt. Die Zusammensetzung des Stoffes Polypropylen ist ideal für die Produktion von Pools. Polypropylene enthalten Schutzelemente gegen UV-Strahlung und gegen chemische Einflüsse von Chemikalien, die für die Wasseraufbereitung eingesetzt werden. Durch die durchgehende Färbung unsere 8 mm starken Platten, können wir nicht nur eine lange optische Garantie abgeben, sondern auch eine lange Lebensdauer und Formstabilität garantieren. Bitte beachten Sie aber, dass die durchschnittliche Wassertemperatur im Pool sich in einem Bereich von +18°C bis +32°C bewegt. Sollte das Pool eingewintert werden, kann natürlich die Temperatur des Wassers bei oder unter 0°C sein.



WICHTIGE INFORMATIONEN

ZUR AUFSTELLUNG IHRES NEUEN POOLS



Kurzfristige Erhitzungen auf bis zu +36°C sind auch möglich. Wird dies längerfristig gewünscht, sollte es vorab mit dem Hersteller des Pools abgeklärt werden. Werden die Temperaturen langfristig überschritten, bleibt zwar die Stabilität des Pools gewahrt, es kann jedoch zu irreversiblen optischen und ästhetischen Veränderungen führen. Weiters ist auch darauf zu achten, dass nur Desinfektionsmittel verwendet werden, die speziell für Polypropylen Pools zugelassen sind. Kontaktieren Sie bitte dazu den Fachhandel Ihres Vertrauens. Beim Einsatz von Chlor zur Wasseraufbereitung sollte die langzeitige Konzentration unter 1,0 mg/l gehalten werden, kurzzeitig kann dieser Wert aber auch auf 3,0 mg/l erhöht werden. Falls die empfohlenen Werte der Chlorkonzentration langfristig überschritten wird, kann es zu Änderung des Farbtons des Pools und Poolzubehör beschädigt werden. Der pH Wert im Pool sollte sich langfristig in einem Bereich von pH 6,5 bis 8,0 bewegen.

ANLIEFERUNG & ABLADEN

Wenn beim Kauf Ihres Pools auch die Anlieferung mit bestellt wurde, sind wir für die Wahl des richtigen Transporters zuständig und Ihr Pool wird bis zur Grundstücksgrenze angeliefert. Wenn der Transport von Ihnen gemacht werden soll, bekommen Sie die Maße und die Gewichtsangaben zur Information, damit Sie den richtigen Transporter bestellen können. In beiden Fällen ist es notwendig, am Tag der Anlieferung einen Kran (oder Lastwagen mit Kranaufsatz) an der Grundstücksgrenze bereitzuhalten. Vereinbaren Sie bitte eine Standzeit des Krans von max. 2 Stunden. Von Werk aus wird das Pool mit 2 Eisenreihen zur Stabilisation angeliefert. Die Kranhaken dürfen nur an diesen Eisenrohren angebracht werden. Wenn beim Entladen und Situieren des Pools die Außentemperatur unter 6°C liegt, ist besondere Vorsicht geboten, da das Material des Pools empfindlicher wird. Der Kranführer hat auch für das notwendige Gurtmaterial zu sorgen.



**** Alle Teile des Pools sind mittels Krangurte so zu fixieren, dass das Pool in Balance bleibt. Für das ordnungsgemäße Abladen und das Einbringen in den Aushub, ist der Kunde oder sein Vertreter verantwortlich. ****



VORBEREITUNGEN DER ANSCHLÜSSE

Folgende Anschlüsse sind Bauseitig von den jeweiligen Professionisten vorzubereiten:

- Wasseranschluss (bei Überlaufbecken notwendig)
- Stromanschluss (der ausführende Elektriker ist hier ist besonders auf die bestellten elektrischen Komponenten hinzuweisen)
- Kanalanschluss



WICHTIGE INFORMATIONEN

ZUR AUFSTELLUNG IHRES NEUEN POOLS


3

VORBEREITUNG DES AUSHUBS

Diese Arbeiten sind bauseitig zu erledigen! Die Abmessungen des Aushubs müssen um mind. 15 cm auf allen Seiten größer sein, als die Außenmasse des Beckens. **Die statische Tragkraft der Stahlbetonplatte muss für eine der Belastung von min. 1.650 kg/m² (bei Pools bis zur Tiefe von 1,5 m) ausgelegt sein.**

Empfohlen wird eine 20 cm dicke Fundamentplatte (Phasenverstärkt oder mit AQ 50 - Bewehrung), die darunterliegende Rollierung (16/32) soll eine Dicke von mind. 10 cm aufweisen. Die maximale Neigung der Fundamentplatte darf +/- 1 mm für Überlaufbecken (hier wird empfohlen, mit einer Ausgleichsmasse zu arbeiten) und +/- 2mm für Pools mit Skimmertechnik, nicht überschreiten.

Zur Isolierung und zum Schutz des Beckens, muss auf die Fundamentplatte (inkl. 15 cm Überstand) eine 3 cm dicke XPS Wärmedämmung aufgelegt werden. Isolation wird von Exportpools mitgebracht.

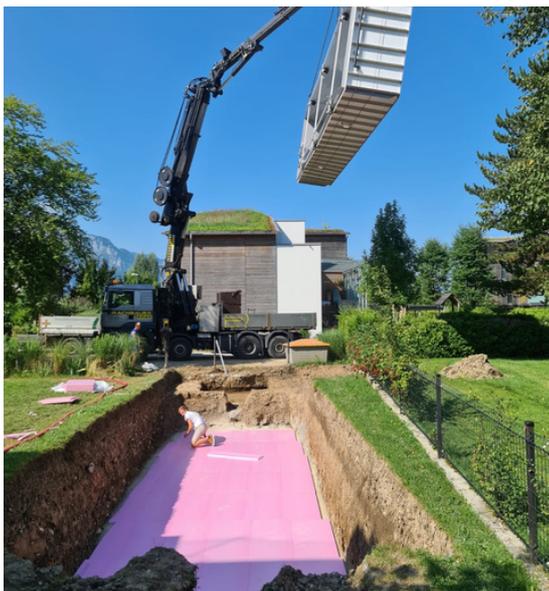

Der Aushub inkl. Hinterfüllung muss durch einen extra beauftragten Professionisten durchgeführt werden und somit geht die Haftung für die richtige Ausführung und eventuelle Folgeschäden am Pool auf den vom Kunden gewählten Professionisten zu 100% über.

Werden die vorgeschriebenen Abmessungen unterschritten (z.B.: wegen Einsparungsmaßnahmen), kann es zu einem Stabilitätsverlust kommen. In diesem Fall ist der Hersteller von der Haftung im Garantiefall befreit. Die ersten 24 Stunden nach der Montage durch unser Team, müssen alle Verklebungen austrocknen können. Erst danach ist der Kleber voll ausgehärtet.

Unterstützung beim Hinterfüllen:

Die Beckenränder sollten beim Befüllen durch Holzstreben gesichert und verstärkt sein.



VOR DEM BETONIEREN

Vor dem Betonieren ca 40 cm Wasser ins Pool füllen. Anschließend (zwischen Erde und Becken) die gleiche Menge Magerbeton (ca 40cm) HÄNDISCH und ERDFEUCHT füllen.

ACHTUNG: Der Druck durch den Betonpumpenwagen könnte durch den Falldruck Schäden und Verformungen am Pool verursachen.

Vorgang in 40cm Schritten wiederholen bis die Umrandung gefüllt ist. **WARNUNG:** Hinterfüllungen mit Kies oder Erde sind nicht zulässig.

WICHTIGE INFORMATIONEN

ZUR AUFSTELLUNG IHRES NEUEN POOLS

Das Betonieren des Pools muss in drei Phasen erfolgen, wobei das Pool zuerst nur zu 1/3 mit Wasser zu füllen ist; erst dann kann mit der Hinterfüllung mit Beton - gleichmäßig am ganzem Umfang des Mantels - begonnen werden. Dieser Vorgang ist bis zum oberen Teil des Pools zu wiederholen. Beim Betonierung dürfen keine Verdichtungs- oder Vibrationsmittel verwendet werden und es darf nicht mittels eines Betonmischer/Pumpe hinterfüllt werden - dies sollte händisch gemacht werden.

FOLGEN SIE UNS SCHON?

Wenn Sie all unsere Tipps und wichtigen Informationen gelesen und beherzt haben, steht einem entspannten Badevergnügen mit der ganzen Familie nichts mehr im Wege! Das gesamte Exportpools Team wünscht viel Spass und würden uns sehr über eine Bewertung auf Google freuen und natürlich können Sie uns auch auf unseren Social Media Kanälen folgen oder uns bei Ihrem Foto taggen!



KUNDENFOTOS

